

Artefactos colectivos del PC1

Comité de Arquitectura e Integración — Pacíficos Online

1. Estudio de factibilidad TELOS

Dimensión	Descripción	Riesgos identificados	Mitigación propuesta
Técnica	Se necesita dominar las tecnologías necesarias para el desarrollo del proyecto, para que este tenga bases sólidas.	Dada la cooperación de todos los subgrupos de trabajo en el proyecto, todas las personas tendrán que manipular lo que se tenga desarrollado, generando posibles incompatibilidades en la manera de trabajar	Mantener una comunicación constante con todos los individuos involucrados en el proyecto, con el fin de trabajar la misma lógica y no tener muchas discrepancias para una mejor manejabilidad de errores.
Económica	<i>Dado a que la naturaleza del proyecto es académica, no entrará en costos económicos como tal ni se incluirá en pasarelas de pago, se realizará con herramientas accesibles para todos los colaboradores y las pruebas se desarrollarán en ambientes propios.</i>	Debido a la envergadura y alcances del proyecto no se entrará en costos económicos, no obstante, se simulará como se desenvolverá en un ambiente de producción real.	Con el fin de asimilar como sería el trabajo a la hora de incurrir en todos los costos necesarios, las transacciones serán realizadas asimilando como sería el flujo si se tratase de una compra real en el mercado.
Legal	<i>El trabajo se llevará a cabo bajo las normativas que se establecen en el documento con las necesidades y cláusulas a seguir, evitando las penalizaciones, simulando la facturación electrónica vigente en Costa Rica, por lo que además se debe considerar leyes de protección de datos y demás.</i>	<i>Penalizaciones por incumplimiento con estándares o medidas relacionadas a la protección de datos.</i> <i>Por lo cual, si el proyecto es llevado a producción, existe la posibilidad de que los individuos involucrados en el proyecto como sus desarrolladores, están expuestos a sanciones.</i>	Investigación activa y consulta con las instituciones reguladoras y encargadas de emitir las legislaciones y certificaciones en torno al ámbito constitucional y legal.
Operativa	<i>Se contará con la designación de roles y canales de coordinación en el trabajo, con el fin de dar apoyo a los siete subgrupos de este proyecto.</i>	<i>Se retrasa el avance debido a que un subgrupo no cumple con lo designado en tiempo y forma.</i> <i>Los acuerdos entre módulos relacionados no</i>	Cada acuerdo o bloqueo entre módulos debe constar en el acta. El grupo afectado por otro módulo no podrá retrasar su propio avance y deberá recurrir al uso de dobles de prueba.

	<i>Algunos roles y canales son: Solicitud de Modificaciones formal, sesión semanal por parte del Comité Coordinador y actas de control y seguimiento.</i>	<i>se documentan y publican en el acta para dejar registro.</i>	
Cronograma (Schedule)	<i>Para garantizar la viabilidad del cronograma (semanas 4 a 16), es vital definir la arquitectura y los contratos desde el inicio, limitando la construcción únicamente al alcance mínimo.</i>	De no estar listos y formalizamos los contratos para el PC3 correspondiente a la semana 11, habría un corto plazo para empezar la construcción.	El Comité dará seguimiento semanal a la publicación de contratos para evitar que se concentren únicamente en la entrega del PC3.

2. Modelo del negocio actual (AS-IS)

Para comprender los puntos de mejora del proceso de ventas, es necesario documentar el flujo de trabajo tal como se ejecuta actualmente en dicho negocio de venta. Este modelo AS-IS describe de manera detallada la interacción entre los tres actores involucrados en una transacción típica, el cliente, el comercio y el banco; cubriendo cada una de las etapas del proceso, desde que se consulta la disponibilidad de un producto por chat, hasta la realización de la transferencia bancaria y posterior despacho del pedido.

El levantamiento de este proceso permite evidenciar que, si bien el negocio logra operar y satisfacer la demanda de los clientes, lo hace mediante una serie de tareas manuales y secuenciales que recaen casi en su totalidad sobre una sola persona. Esta dependencia genera puntos críticos en los que el flujo completo puede detenerse o retrasarse, afectando tanto la experiencia del cliente como el control interno del negocio, es gracias a este análisis que se pueden identificar una serie de cuellos de botella que afectan directamente la eficiencia, la trazabilidad y la escalabilidad del proceso, así como los principales actores de este.


2.1 Actores identificados

- Actor 1 — Comercio
- Actor 2 — Cliente
- Actor 3 — Banco

2.2 Cuellos de botella identificados

- Verificación manual del inventario
- Verificación manual del comprobante de pago en el teléfono
- Registro de venta condicional
- Proceso secuencial sin paralelismo
- Canal de comunicación único

2.3 Diagrama de actividad

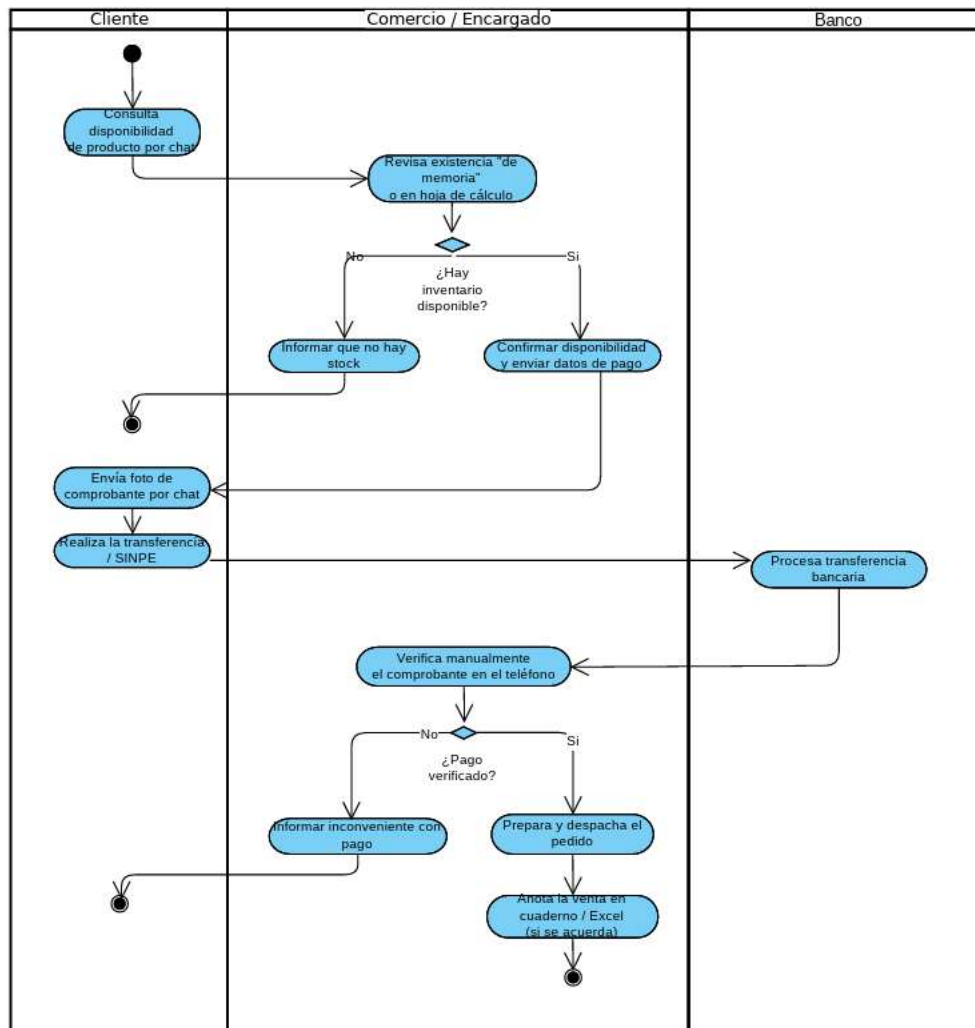

3. Mapa de módulos

Módulo	Nombre	Alcance incluido	Alcance excluido	Depende de
M1	Portal público y búsqueda	Página principal, buscador global, categorías y subcategorías, comercios y productos destacados, promociones, noticias, diseño adaptable a móvil, vista del micrositio de cada comercio.	No administra el contenido del micrositio (M2). No mantiene el catálogo ni decide disponibilidad de producto (M3). No procesa el carrito ni el pago (M5, M6).	M2, M3
M2	Micrositios y administración de comercios	Panel del comercio, información empresarial, logotipo, banners, galería, horarios, redes sociales, políticas; incorporación, aprobación y suspensión de comercios; comisiones, membresías y publicidad.	No gestiona productos ni variaciones (M3). No lleva existencias ni kardex (M4). No procesa pagos ni emite facturas (M6).	Núcleo
M3	Catálogo de productos	Productos, variaciones, imágenes y video, SKU, código de barras y de fabricante, marcas, categorías, etiquetas, productos relacionados y destacados, disponibilidad declarada del producto.	No lleva el conteo real de existencias ni el kardex (M4). No decide si un comercio está activo o suspendido (M2).	M2
M4	Inventario multiempresa	Existencias por comercio y ubicación, entradas, salidas, kardex (registro de movimientos de cada producto), transferencias,	No crea ni edita productos o variaciones (M3). No decide el monto ni el estado de un pedido (M5).	M3

		inventario físico, mínimos, alertas de reposición, historial y reportes de inventario.		
M5	Carrito y gestión de pedidos	Carrito con productos de varios comercios, impuestos, envío, cupones, tarjetas de regalo, lista de deseos; ciclo del pedido hasta la entrega con seguimiento en tiempo real de su estado, cancelación y devolución; definición y soporte del modelo de carrito unificado para compras multicomercio.	No procesa el pago ni genera la factura (M6). No descuenta existencias en su propia tabla, las solicita a M4 por contrato. No registra asientos contables (M7).	M3, M4, M6
M6	Pagos y facturación electrónica	Medios de pago con tarjeta, SINPE y PayPal; confirmación, conciliación, reembolsos; facturas, notas de crédito y de débito, documento XML.	No crea el pedido ni decide su estado inicial (M5). No registra el asiento contable de la venta, solo publica el evento que M7 consume.	M5
M7	ERP contable y reportes gerenciales	Plan de cuentas, asientos automáticos, diario, mayor, balance, estado de resultados, cuentas por cobrar y por pagar, centros de costo, reportes y tablero ejecutivo.	No genera la factura ni procesa el pago (M6). No gestiona pedidos ni carrito (M5); solo consume los eventos que estos publican.	M5, M6, M2
